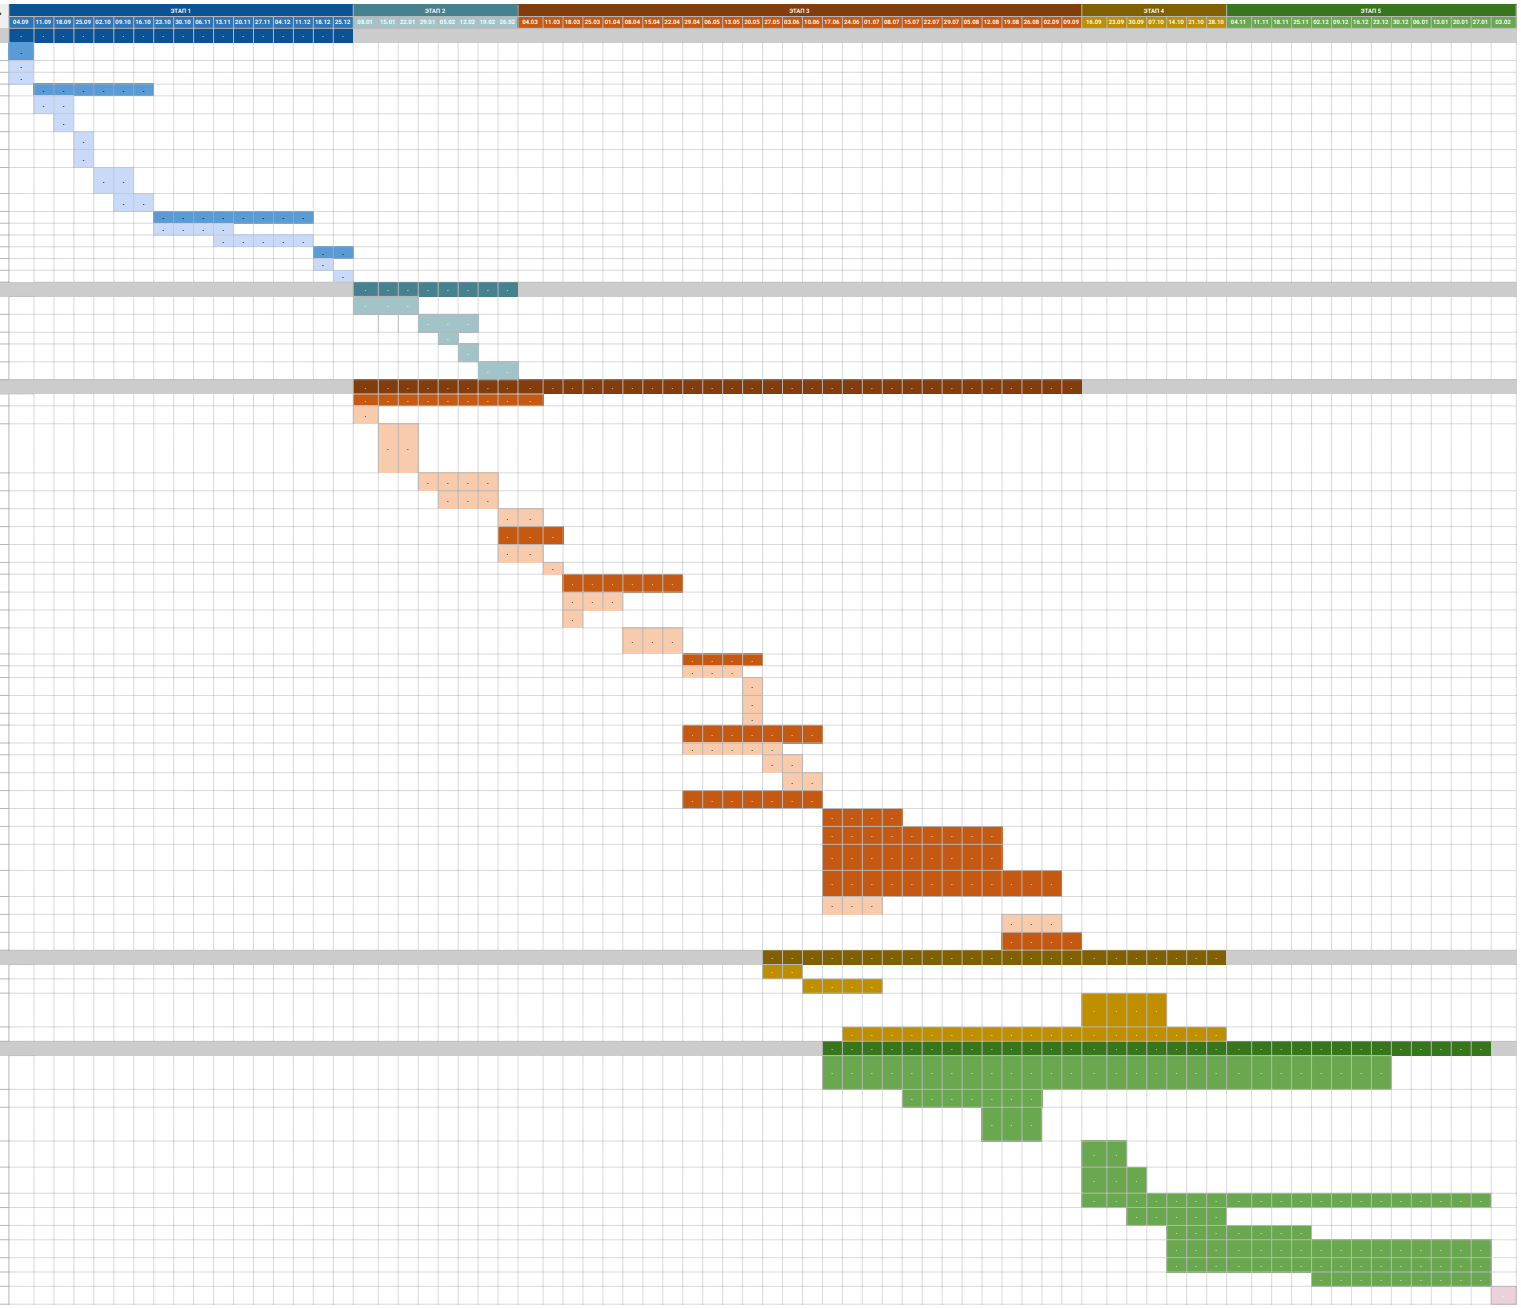НОМЕР ИСР	НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ	НАЧАЛО	ОКОНЧАНИЕ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	ВЫПОЛНИТЬ ПОСЛЕ
1	**Разработка проекта**	**04.09.23**	**29.12.23**	**116**	-
1.1	**Создание устава проекта**	**04.09.23**	**08.09.23**	**5**	
1.1.1	Разработка устава	04.09.23	07.09.23	4	
1.1.2	Согласование устава	08.09.23	08.09.23	1	
1.2	**Исследование**	**11.09.23**	**20.10.23**	**40**	**1.1**
1.2.1	Анализ рынка и конкурентов	11.09.23	22.09.23	12	
1.2.2	Определение целевой аудитории	20.09.23	22.09.23	3	
1.2.3	Разработка концепции проекта	25.09.23	29.09.23	5	
1.2.4	Изучение законодательства	26.09.23	28.09.23	3	
1.2.5	Создание финансово-экономической модели	02.10.23	13.10.23	12	
1.2.6	Определение стратегии	09.10.23	20.10.23	12	
1.3	**Проектирование**	**23.10.23**	**15.12.23**	**53**	**1.2**
1.3.1	Сбор требований	23.10.23	17.11.23	25	
1.3.2	Разработка ТЗ	13.11.23	15.12.23	33	
1.4	**Планирование**	**18.12.23**	**29.12.23**	**12**	**1.3**
1.4.1	Составление бюджета	18.12.23	22.12.23	5	
1.4.2	Составление плана	25.12.23	29.12.23	5	
2	**Дизайн**	**09.01.24**	**01.03.24**	**53**	**1**
2.1	**Разработка дизайн-концепции**	**09.01.24**	**26.01.24**	**18**	**1**
2.2	**Дизайн клиентского МП**	**29.01.24**	**16.02.24**	**18**	**2.1**
2.3	**Дизайн МП техника**	**05.02.24**	**09.02.24**	**5**	**2.1**
2.4	**Дизайн веб-сайта для оператора**	**12.02.24**	**16.02.24**	**5**	**2.1**
2.5	**Дизайн клиентского веб-сайта**	**19.02.24**	**01.03.24**	**13**	**2.2**
3	**Разработка**	**09.01.24**	**13.09.24**	**245**	**1, 2**
3.1	**Выбор железа**	**09.01.24**	**07.03.24**	**59**	**1**
3.1.1	Определить требования к дронам	09.01.24	12.01.24	4	
3.1.2	Определить требования к контейнерам, зарядным станциям, складам, грузовым контейнерам	15.01.24	26.01.24	12	
3.1.3	Сравнение и выбор дронов	29.01.24	22.02.24	24	3.1.1, 3.1.2
3.1.4	Сравнение и выбор остального железа	29.01.24	22.02.24	24	3.1.1, 3.1.2
3.1.5	Закупка тестовых образцов	26.02.24	07.03.24	12	3.1.3, 3.1.4
3.2	**Проектирование системы**	**26.02.24**	**15.03.24**	**20**	**3.1.3, 3.1.4**
3.2.1	Разработка архитектуры системы	26.02.24	07.03.24	12	
3.2.2	Проектирование БД	11.03.24	15.03.24	5	
3.3	**Разработка центра управления полетами**	**18.03.24**	**27.04.24**	**40**	**3.2**
3.3.1	Разработка алгоритма диспетчеризации	18.03.24	05.04.24	18	3.2
3.3.2	Интеграция сервисов прогноза погоды	18.03.24	22.03.24	5	3.2
3.3.3	Разработка сервиса построения полетных планов	08.04.24	27.04.24	20	3.3.1
3.4	**Интеграция железа**	**02.05.24**	**24.05.24**	**23**	**3.3**
3.4.1	Интеграция дронов	02.05.24	17.05.24	16	3.3
3.4.2	Интеграция грузовых отсеков	20.05.24	24.05.24	5	3.4.1
3.4.3	Интеграция зарядных станций	20.05.24	24.05.24	5	3.4.1
3.4.4	Интеграция складов	20.05.24	24.05.24	5	3.4.1
3.5	**Разработка сервиса управления заказами**	**02.05.24**	**14.06.24**	**43**	**3.3**
3.5.1	Разработка сервиса	02.05.24	31.05.24	30	3.3
3.5.2	Интеграция платежных систем	27.05.24	07.06.24	11	
3.5.3	Интеграция бухгалтерских систем	03.06.24	14.06.24	12	3.5.1
3.6	**Разработка МП техника**	**02.05.24**	**14.06.24**	**43**	**3.3**
3.7	**Разработка веб-сайта оператора**	**17.06.24**	**12.07.24**	**26**	**3.3**
3.8	**Разработка клиентского МП**	**17.06.24**	**16.08.24**	**60**	**3.5**
3.9	**Разработка клиентского веб-сайта**	**17.06.24**	**16.08.24**	**60**	**3.5**
3.10	**Разработка обучающих материалов**	**17.06.24**	**06.09.24**	**80**	
3.10.1	Обучающий контент для сотрудников	17.06.24	05.07.24	19	
3.10.2	Обучающий контент для клиентов	19.08.24	06.09.24	18	5.2
3.11	**Интеграционное тестирование**	**19.08.24**	**13.09.24**	**25**	
4	**Мат. обеспечение**	**27.05.24**	**01.11.24**	**155**	**3.4**
4.1	**Закупка железа**	**27.05.24**	**07.06.24**	**11**	**3.4**
4.2	**Доставка железа**	**10.06.24**	**05.07.24**	**26**	**4.1**
4.3	**Подготовка железа (сборка, прошивка, первичное техобслуживание)**	**16.09.24**	**11.10.24**	**26**	**3.4, 3.10.1, 4.2**
4.4	**Хранение железа**	**24.06.24**	**01.11.24**	**128**	**4.3**
5	**Запуск**	**17.06.24**	**31.01.25**	**225**	
5.1	**Разработка и проведение маркетинговой кампании**	**17.06.24**	**27.12.24**	**191**	
5.2	**Первичное наполнение БД ВПП**	**15.07.24**	**30.08.24**	**46**	**3.6**
5.3	**Создание шаблонов юридических документов для клиентов**	**12.08.24**	**30.08.24**	**19**	
5.4	**Развертывание продовой инфраструктуры**	**16.09.24**	**27.09.24**	**12**	**3.11**
5.5	**Публикация приложений в маркетах**	**16.09.24**	**04.10.24**	**19**	**3.11**
5.6	**Исправление ошибок**	**16.09.24**	**31.01.25**	**136**	**5.5**
5.7	**Размещение железа в городах**	**30.09.24**	**01.11.24**	**32**	**3.11.2, 4.3**
5.8	**БЕТА ЗАПУСК**	**14.10.24**	**29.11.24**	**46**	**5.5**
5.9	**Обработка обращений пользователей**	**14.10.24**	**31.01.25**	**108**	**5.8**
5.10	**Обслуживание железа**	**14.10.24**	**31.01.25**	**108**	**4.3**
5.11	**РЕЛИЗ**	**02.12.24**	**31.01.25**	**60**	**5.8**
5.12	**Оценка эффективности**	**27.01.25**	**07.02.25**	**11**
